


RAPPORT DE PROJET HUBERT BERCKES

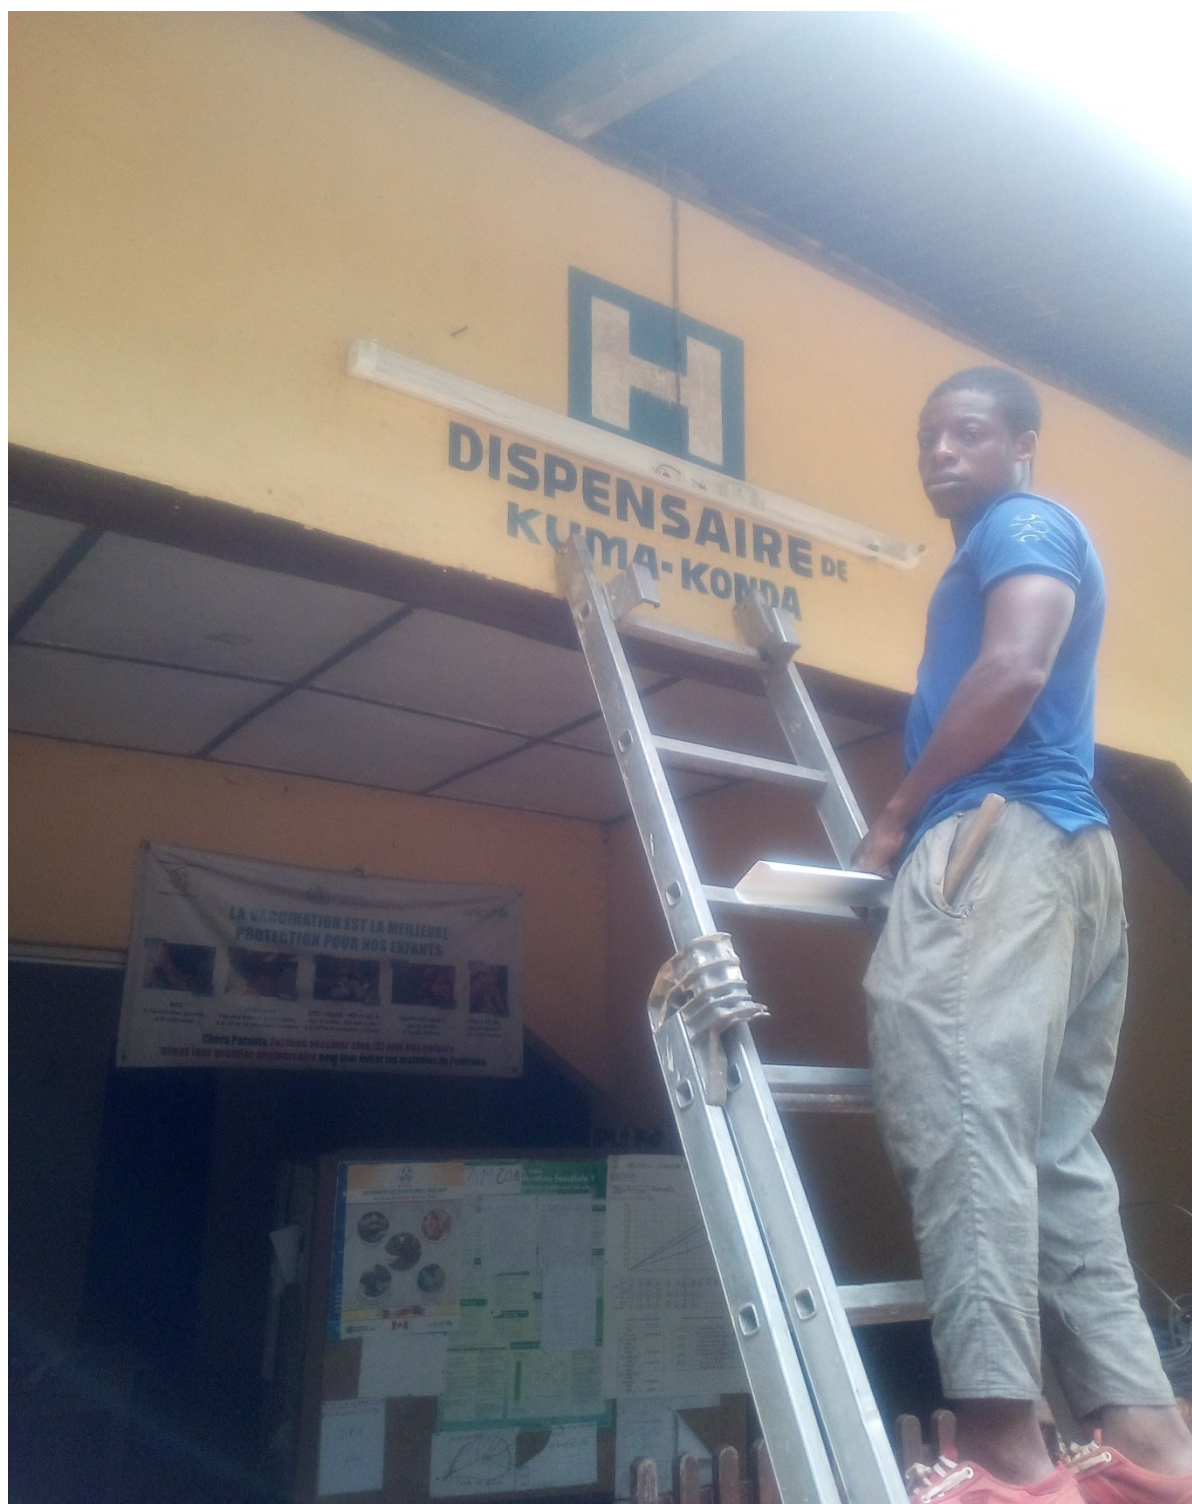

I. INTRODUCTION

Le projet Santé pour tous intitulé : Projet Hubert BERCKES, projet de rénovation et de réhabilitation du centre de santé de Kouma Konda élaboré par ONG CADR rentre dans le cadre des objectifs de DIPPECH HELLEFT asbl dans sa volonté de venir en aide aux populations défavorisée du Togo. Il consiste à la rénovation et réhabilitation du centre de santé Kouma Konda. Projet entièrement financé par la famille BERCKES en mémoire d'Hubert BERCKES.

II. OBJECTIFS DU PROJET

Les situations socio politiques et économiques que le Togo traverse a entraînée une détérioration des infrastructures et équipements sanitaires à cause de l'insuffisance et manque des ressources allouées à ce secteur. Le projet santé pour tous pour Kouma intitulé projet Hubert BERCKES vise à améliorer les conditions sanitaires de la population du canton de Kouma par la réhabilitation de ses infrastructures sanitaires, la revalorisation des soins de santé primaires en particulier celle du village de Kouma Konda.

III. EXECUTION DU PROJET

Le calendrier d'exécution du projet a accusé un léger retard du principalement aux formalités administratives pour l'accord de démarrage, au planning des travaux avec ONG CADR, aux problèmes liés par rapport à l'exécution et coordination du projet. En outre des imprévus et omissions sur le devis initial aussi y ont participés. Néanmoins, les travaux ont démarré le 10 mai.

IV. ACTIVITES PREVUES

Les activités prévues concernent le bâtiment principal de santé et le logement de la personne médicale en charge qui est l'accoucheuse. il s'agit d'un premier temps de recouvrir le compteur électrique et une réinstallation des accessoires électriques .après la menuiserie consistant à changer certaines tôles sur le toit, réajuster et replacer toutes les fenêtres car toutes déformées du à l'abandon du centre pendant de longs moments, et fabriquer des nouvelles portes et fenêtres pour le logement du responsable médical ,ensuite plafonner les chambres ou il n y en a pas. la maçonnerie, peinture et badigeons des bâtiments ,puis un fond alloué pour l'approvisionnement en produits de traitements.

V. ACTIVITES REALISEES

Toutes les activités citées ci-dessus on été réalisées avec succès.



Nouveau compteur recouvert











VI. DIFFICULTES RENCONTREES

La ponctualité et le non respect du planning des activités par les acteurs impliqués est de règle. la distance et faute de moyen de déplacement de Kpalimé à Kouma Konda à un peu agit sur moi car les taxi motos n'aiment pas tous aller jusque là. Certaines exigences des bénéficiaires non inclus dans le projet ont été au cœur de quelques soucis.

VII. RECO MMANDATIONS

A la lumière de l'expérience et des leçons tirées, les recommandations suivantes sont formulées :

A DIPPECH HELLEFT

Bien que quelques feuilles de tôles on été changées, je pense qu'il serait bien dans un court délai penser à refaire la toiture complète du bâtiment principal car toute la toiture est pourrie ;ce qui n'a pas été inclus dans le devis global du projet bien sur et ce qui pourra endommager les plafonds lors d'intenses pluies.

VIII. CONCLUSION

La réalisation du projet a permis de doter le centre de santé de Kouma Konda d'électricité et de redonner presque une nouvelle vie au local. La performance globale est assez positive dans la mesure où la majorité des objectifs du projet on été atteint malgré quelques itinérances dans son exécution. L'impact social du projet est évident.

Fait à Kpalimé, le 25 juin 2017

Le représentant de DIPPECH HELLEFT au Togo

DISPE
KUM

Rénovation, Réhabilitation du dispensaire
de Kuma-Konda faite par la famille **BERCKES**
En mémoire de **Hubert BERCKES** réalisée
par **DIPPECH HELLEF** assistée par **ONG-CADR**

Mr GBIDI komlan Atsu

(00228)90085018
